

Звіт про стан реалізації
громадського проекту № 174 "Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро "Сирець" автора Бернасовської О.В.
за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва

станом на 01.01.2018 року
(відповідний звітний період)

Регістраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи		Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)	
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
							План			Факт (касові видатки)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець»	Виконання громадського проекту відбувалося у два етапи. Перший етап - розробка проекту на встановлення освітлення: визначення через систему "Прозоро" переможця на розробку проекту на виконання робіт. 15.06.2017 в системі електронних закупівель "Прозоро" оголошено закупівлю на визначення організації з розробки проекту об'єкта, за результатами аукціону визначено переможця на виконання проектних робіт; розроблено проектно-кошторисну документацію, проект на встановлення освітлення та отримано позитивний висновок експертизи. Другий етап - виконання робіт з влаштування освітлення в парку: за допомогою системи електронних закупівель Прозоро (закупівля від 23.10.2017) визначено підрядну організацію на виконання робіт з капітального ремонту. За результатами аукціону укладено договір від 30.11.2017 з переможцем торгів; виконано земляні роботи (розробка ґрунту вручну в траншеях, копання ям для стовпів і стовпів), будівельні роботи (влаштування трубопроводів із поліетиленових труб), монтажні (встановлення під обладнання сталевих конструкцій, встановлення опор з металевих труб, розведення по пристроях і підключення жил кабелів), пусконаладка (встановлення світильників, влаштування стержневого заземлення), відновлення благоустрою після розривів. Роботи виконані в повному обсязі.	880,7	880,7	0,0	Влаштування освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець»	880,7	880,7	У зв'язку із погіршенням погодних умов (промерзання ґрунту та снігопади) не виконано роботи з посіву трави, які передбачено у проекті. Посів трави буде виконано власними силами навесні 2018 року за рахунок коштів поточного благоустрою.	Провідними фахівцями ефективно, вчасно та якісно проведено роботи з влаштування освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець».
Разом по розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства Подільської РДА:			880,7	880,7	0,0	-	880,7	880,7	-	

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства Подільського району м. Києва
В.о.директора



В. Кухарчук
О.Манько

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту

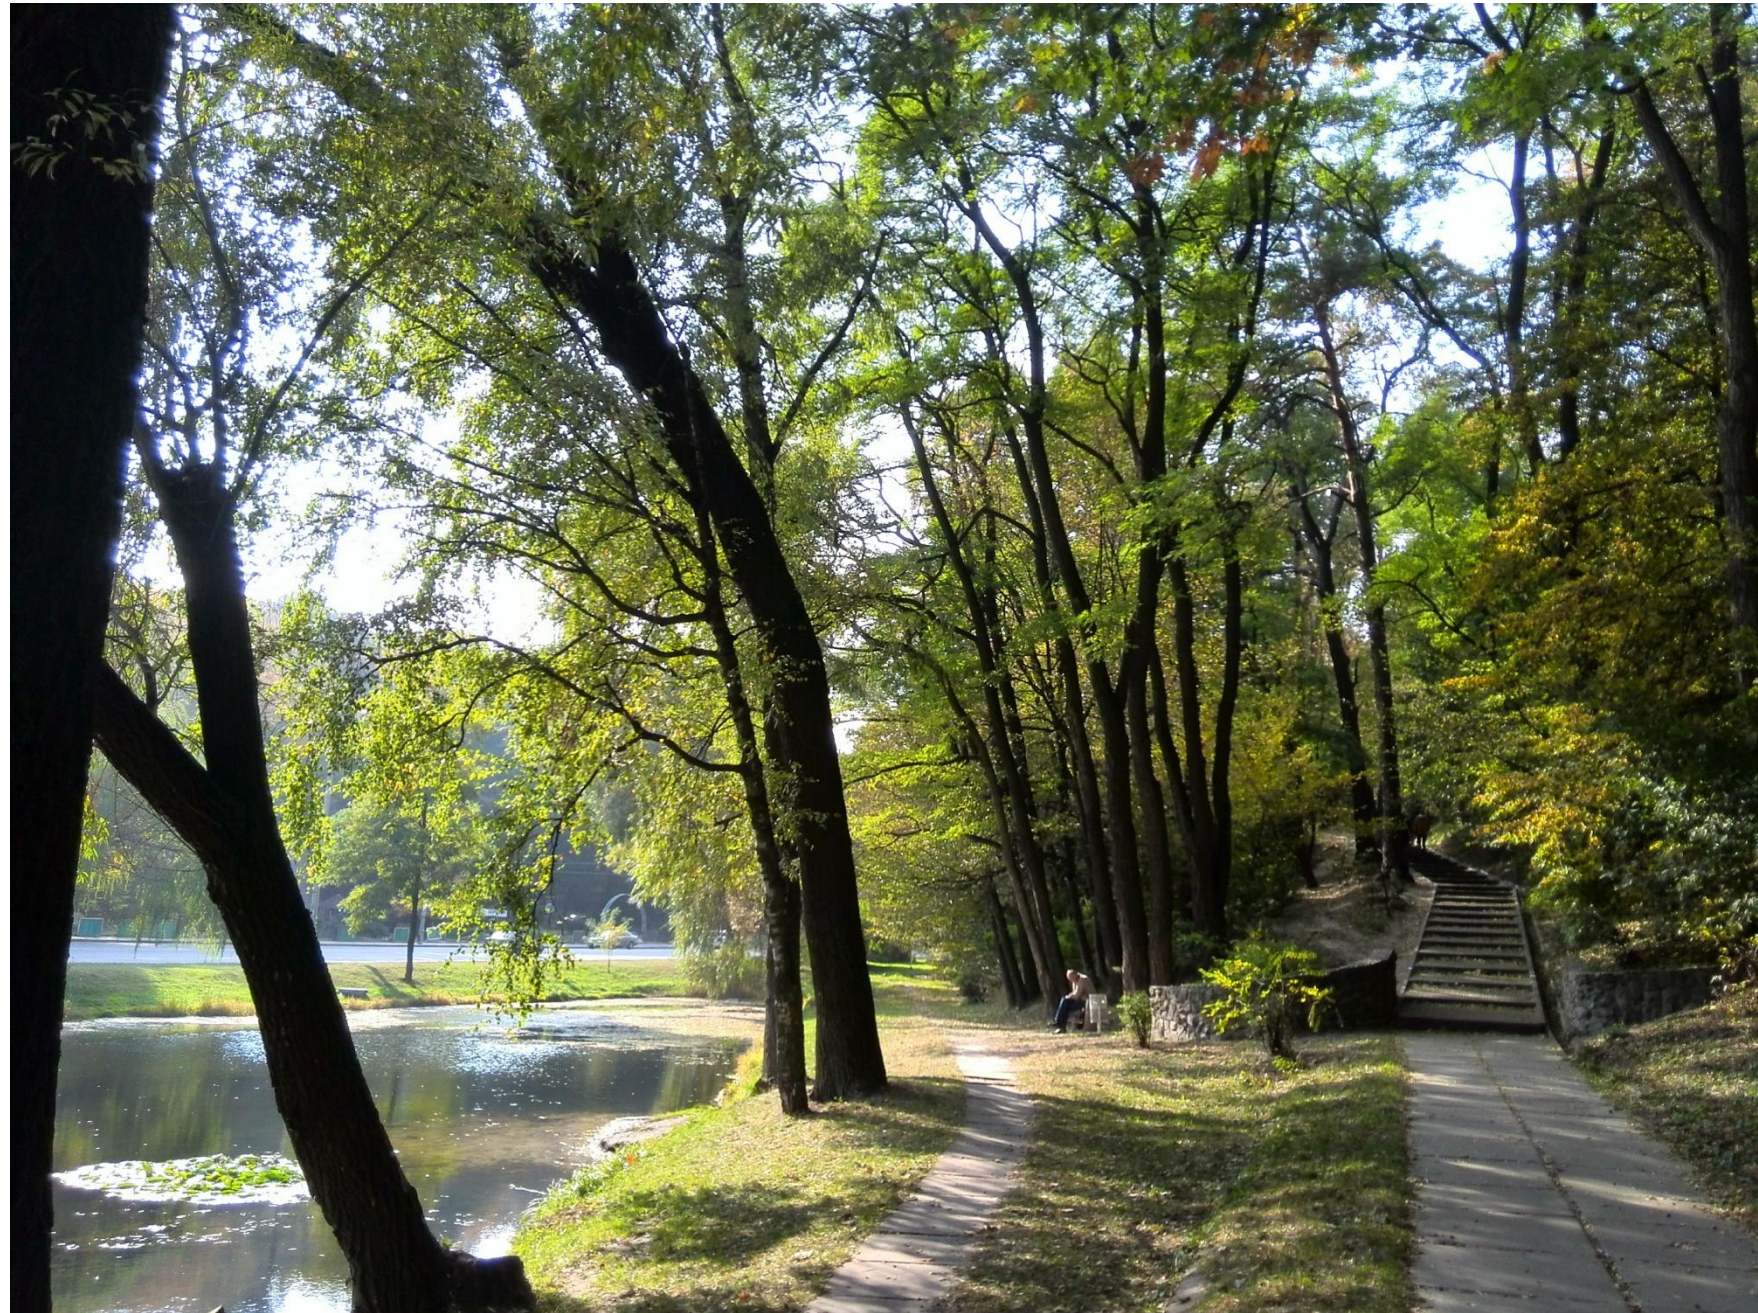


Фото об'єкту після реалізації громадського проекту



